



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

ОРДЕР
на производство земляных работ, обустройство и
содержание строительной площадки

01 октября 2009

№ 09022390/ 3/1

срок действия до 30.12.2009

Производитель работ ВОРОВЬЕВ П.Г.

Подрядная организация ЗАО "315 УНР"

109263 г. Москва ул. Шкулева, 13/25 корп.3 телефон: 1786509 1792966

Субподрядные организации ПРОМИНТЕР ЗАО; 615 СТРОЙ УПРАВ ЗАО; СВЯЗЬСТРОЙ ПМК ЗАО; СК ПРОГРЕСС ООО; УПТК ОАО ДОМОСТРОИТЕЛЬН КОМБ 1;

Организация- ЗАО "Терра Аури"

Заказчик 119017 г. Москва ул. Б. Ордынка, 40 стр.4 оф.601 телефон: 641 22 79

Наименование проекта Комплекс жилых домов серии П44Т

Назначение объекта ЖИЛОЙ ДОМ

Вид строительства СТРОИТЕЛЬСТВО

Адрес производства работ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я УЛИЦА, 3

Административный округ города Москвы СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ

Район города Москвы АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Уточнение адреса СТР.2,3,4,5,6,9,10,11,13,14,15

РАЗРЕШЕНО ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

| | |
|--|----------|
| Кабель в/в | 400 п.м. |
| Обустройство и содержание стройплощадки при производстве строительно-монтажных работ | 1 объект |
| Телефонная канализация | 204 п.м. |
| * * * * * | |

Условия выполнения работ указаны в Проекте производства работ (ППР), который должен находиться на объекте. Ордер действителен на указанные в нем вид, объем, срок и место проведения работ в соответствии с прилагаемыми схемой и графиком производства работ (с отметкой ОАТИ г.Москвы).

Начальник Технической инспекции



вед. специалист
(Должность)

Чепурной Г.Д.

Исполнитель, ответственный за подготовку ордера

Диброва Т.П.

Расшифровка подписи

Ордер получил

Специалист отдела тех. ин. Которничева А.Т. ЗАО "Терра Аури"

(Подпись)

(Должность)


Расшифровка подписи

017071

О
А
Т
И
О
А
Т
И
О
А
Т
И
О
А
Т
И

СХЕМА

Строительная площадка на период строительства жилых домов на территории ОАО Экспериментальный завод «Металлист» по адресу: г. Москва, СВАО, ул. 3-я Мытищинская, вл.3, корп. 1, 2.

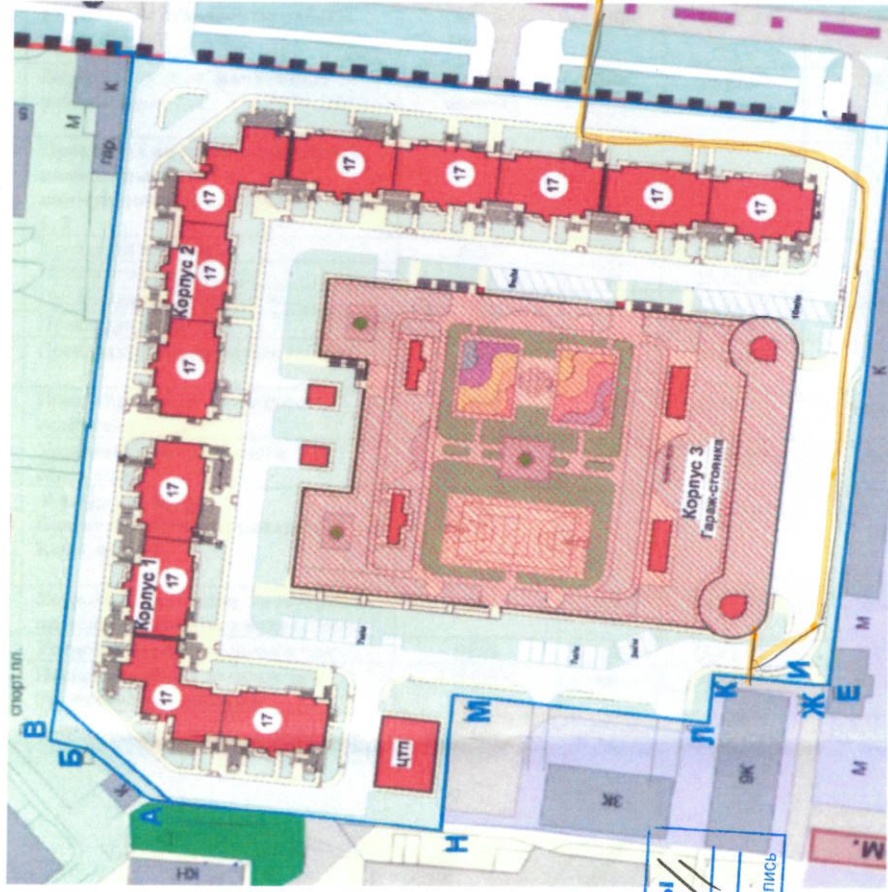

ОАТИ города Москвы
К ордеру 0002390/21
Должность, Ф.И.О. _____
Подпись _____

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. И. К. Л. М. Н. А

граница участка, отведенного под застройку



- проектируемая застройка



- существующая застройка



- перспективная застройка



- демаркация

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО «315 УНР»



Завязкин В.Н.

«СОГЛАСОВАННО»

Генеральный директор
ОАО Экспериментальный завод «Металлист»



Филиппов В.А.

Генеральный директор
ЗАО «Терра Аурис»



Белюченко А.В.

«Согласовано»

«Утверждаю»

директор
«Терра Аурис»

Управа района
«Алексеевский»

Ген. директор ЗАО «315 УНР»

Белюченко А.В.

Завязкин В.Н.



ГРАФИК

производства работ на основной период строительства жилых домов серии П44Т
корпуса 1, 2 по адресу: г. Москва, СВАО, ул. 3-я Мытищинская, владение 3.

| № п/п | Наименование работ | Объём работ | Ед. Изм. | Начало | Окончание | Исполнитель |
|----------------|--|------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Монтаж сборных ж/б конструкций надземной части корпусов 1, 2 | Согласно проекта | М3 | 25.09.09 1.10.09 | 30.12.09 | ДСК-1 |
| 2 | Внутренние отделочные работы корпусов 1, 2 | Согласно проекта | М2 | 10.11.09 | 30.12.09 | ДСК-1 |
| 3 | Внутренние спец. монтажные работы корп. 1, 2 | Согласно проекта | м/п | 30.11.09 | 30.12.09 | ООО «СК-Прогресс» |
| 4 | Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций к корпусам: 1, 2 | | | | | |
| 4.1 | Прокладка теплосети | 362.5 | м | 25.09.09 | 30.10.09 | ЗАО «315 УНР» |
| 4.2 | Прокладка водопровода | 473 | м | 25.09.09 | 30.10.09 | ЗАО «315 УНР» |
| 4.3 | Прокладка канализаций | 611 | м | 25.09.09 | 10.11.09 | ЗАО «315 УНР» |
| 4.4 | Прокладка водостока | 490 | м | 25.09.09 | 10.11.09 | ЗАО «315 УНР» |
| 4.5 | Прокладка низковольтных кабелей | 400 | м | 25.09.09 | 15.11.09 | ДСК-1 |
| 4.6 | Прокладка кабеля наружного освещения | 1048 | м | 25.09.09 | 15.11.09 | ДСК-1 |
| 4.7 | Установка опор наружного освещения | 30 | шт. | 15.10.09 | 10.12.09 | ДСК-1 |
| 5 | кабель 4/3 Благоустройство территории Корпусов 1,2 | 400 | п/м | 15.10.09 | 10.12.09 | |
| 5.1 | Устройство проездов, тротуаров и площадок с твёрдым покрытием. | 2689 | м2 | 10.11.09 | 30.12.09 | ЗАО «315 УНР» |
| 5.2 | Устройство растительного слоя. | 9152 | м2 | 15.11.09 | 30.12.09 | ЗАО «315 УНР» |
| 5.3 | Посадка зелёных насаждений (деревьев/кустарников) | 118/2096 | шт. | 15.11.09 | 30.12.09 | ЗАО «315 УНР» |

Головкин Канализация 204 п/м. 15.10.09 10.12.09

Согласовано:
генеральный директор
ЗАО «315 УНР»
В.А. Реленков

Ответственный от ЗАО «315 УНР»
Начальник СМУ-3

Воробьев П.Г.

Работа по контролю котла и
подземной части, выполнено без ордера.

Спец. отд. регистрации. Гагаринцева А.Г.
ЗАО «Терра Аурис»



Исправл. Вер. Гагаринцева А.Г. ЗАО «Терра Аурис»

Испр. Вер.
